

# DNIT

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES



# OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E PAVIMENTAÇÃO

# APRESENTAÇÃO


- Malha rodoviária federal no Maranhão: 3262,00 km;
- Total de contratos de manutenção vigentes: 21;
- Total de contratos de construção vigentes: 5;
- LOA 2018 (manutenção): R\$ 171.972.869,00;
- Para conclusão das obras de construção dos três lotes da BR-135/MA, BR-226/MA e Travessia Urbana de Imperatriz/MA: R\$ 310.604.233,94.




**Tipos de Intervenção**


- DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO 102,30 Km
- IMPLANTAÇÃO 125,90 Km
- OBRA DO PAC

**Total 228,20 Km**

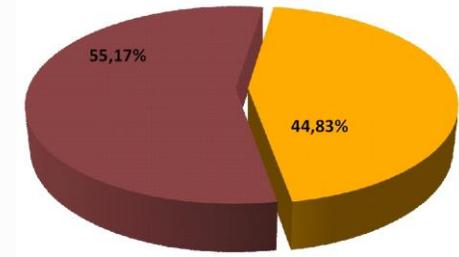

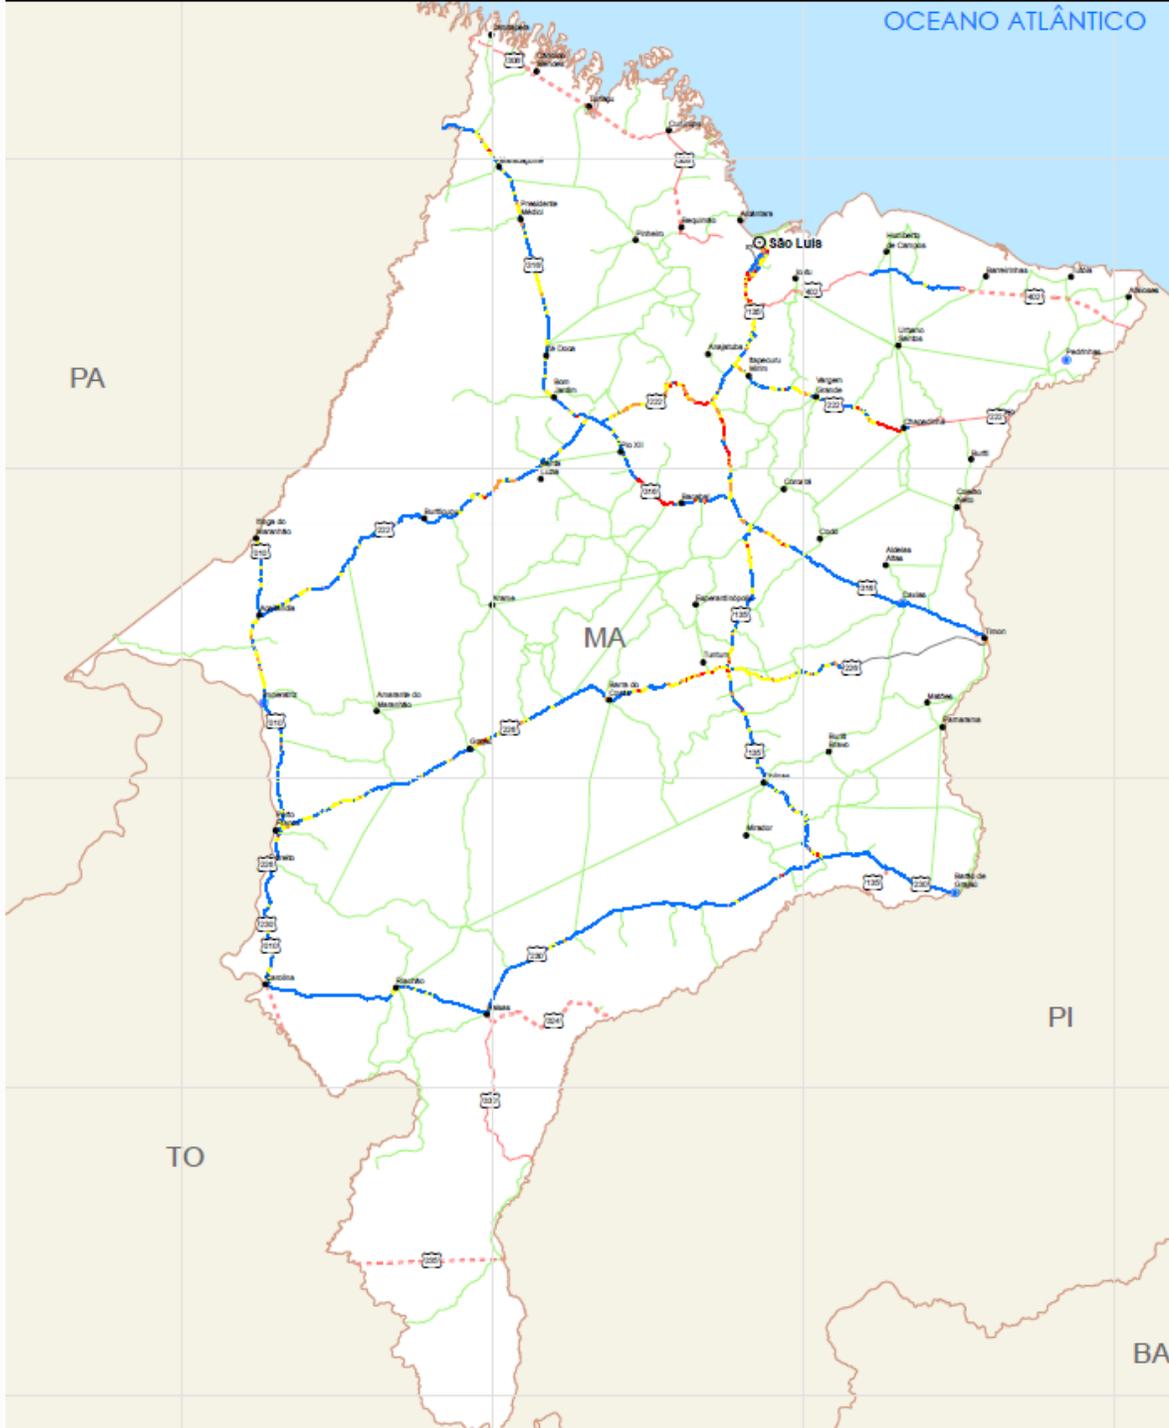

FAIXA	CONDIÇÃO
ICM < 30	BOM
30 < ICM < 50	REGULAR
70 < ICM < 70	RUIB
ICM > 70	PÉSSIMO

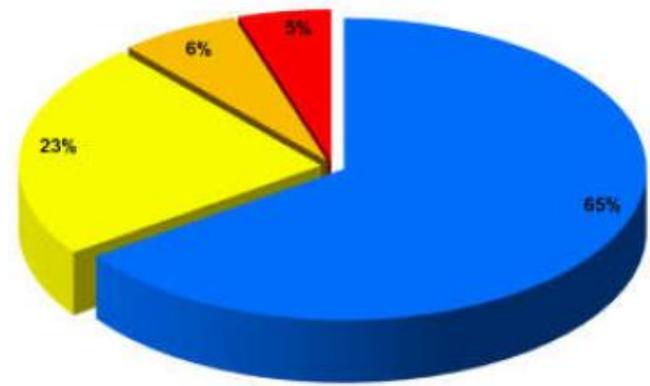

Nota:  $ICM = 70 \times IP + 30 \times IC$

# 1. Duplicação BR-135/MA: Estiva/Bacabeira

- Segmento de execução: km 25,00 ao km 51,30 (26,30 km de extensão);
- Valor do contrato atualizado: R\$ 503.363.067,39;
- Total medido até o mês de fevereiro/2018: R\$ 468.587.592,52 (93,26%);
- Saldo contratual: R\$ 34.775.474,87;
- Saldo empenhado: R\$ 16.650.887,21;
- Prazo de término dos serviços: dez/2018;

INÍCIO  
E-1240  
(KM 24,8)

**SENTIDO  
SÃO LUÍS**

**CAMPO DE PERIZES  
PISTA ESQUERDA**  
RESTAURAÇÃO AINDA NÃO INICIADA

PISTA ESQUERDA

PISTA DIREITA

**CAMPO DE PERIZES**

PISTA DIREITA

PISTA ESQUERDA

PISTA ESQUERDA

PISTA DIREITA

**PERIZ DE BAIXO/CIMA  
PISTA ESQUERDA**  
PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ CONCLUÍDA  
E SINALIZADA

**PERIZ DE BAIXO  
PISTA DIREITA**  
PAV. C/ CBUQ CONCLUÍDA

**SENTIDO  
BACABEIRA**

CANTEIRO  
DE OBRA

TERMINO  
E-2565  
(KM 51,3)

**CAMPO DE PERIZES  
PISTA DIREITA**  
PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ CONCLUÍDA  
E SINALIZADA  
EM ANDAMENTO DRENAGEM

**PERIZ DE BAIXO**

**PERIZ DE CIMA**

USINA

**BACABEIRA**

**PERIZ DE CIMA (EM FRENTE A USINA)  
PISTA DIREITA**  
PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ CONCLUÍDA

**VIADUTO DE BACABEIRA  
PAVIMENTAÇÃO**  
PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ CONCLUÍDA  
BARREIRA CENTRAL E GUARDA-RODAS DEVEM  
SER CONCLUÍDOS ATÉ 22/02/2018

## LEGENDA

-  PAVIMENTO NOVO - TRECHO NÃO TRINCADO
-  PAVIMENTO ANTIGO
-  TRECHO SEM PAVIMENTO
-  ESTAQUEAMENTO - PISTA ESQUERDA
-  ESTAQUEAMENTO - PISTA DIREITA

# 1. Duplicação BR-135/MA: Estiva/Bacabeira




Viaduto de Bacabeira/MA



Campo de Perizes

## 2. Duplicação BR-135/MA: Bacabeira/Outeiro

- Segmento de execução: km 51,30 ao km 95,60 (44,30 km de extensão);
- Valor do contrato atualizado: R\$ 106.845.000,00;
- Total medido até o mês de novembro/2017: R\$ 2.581.048,10 (2,35%);
- Saldo contratual: R\$ 104.263.951,90;
- Saldo empenhado: R\$ 82.011.630,18;
- Prazo de término dos serviços: jun/2019;

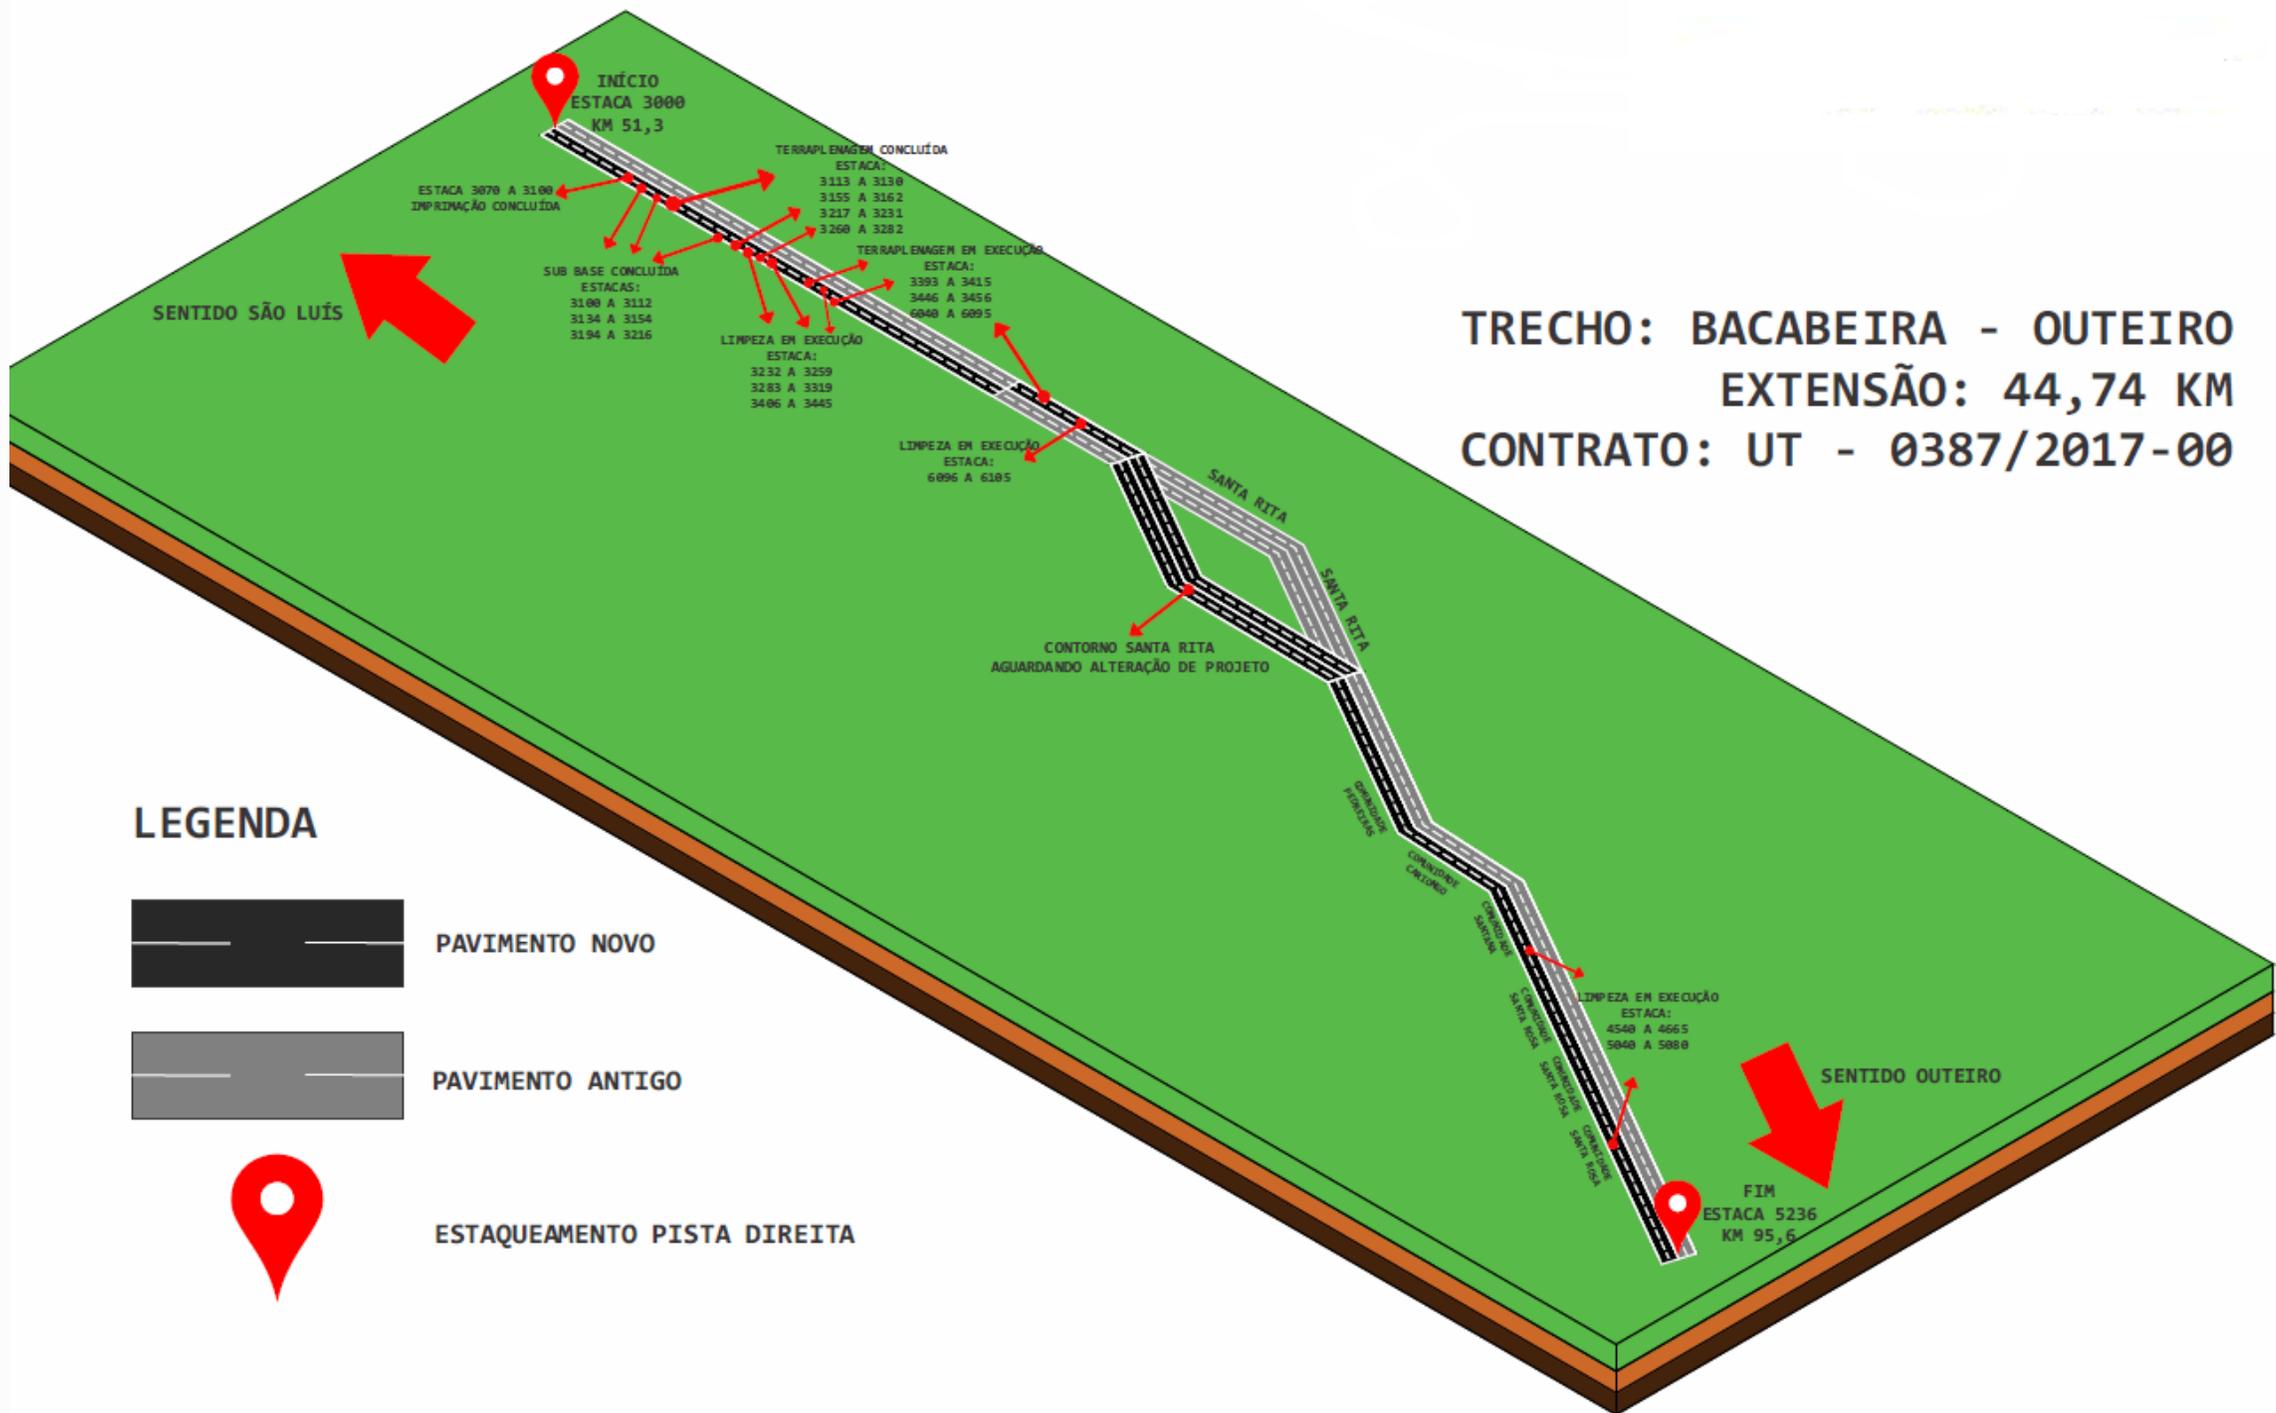

## 2. Duplicação BR-135/MA: Bacabeira/Outeiro




Limpeza de terreno



Terraplenagem

### 3. Duplicação BR-135/MA: Outeiro/Miranda

- Segmento de execução: km 95,60 ao km 127,75 (32,15 km de extensão);
- Valor do contrato atualizado: R\$ 66.433.599,75;
- Total medido até o mês de fevereiro/2018: R\$ 1.933.698,90 (2,86%);
- Saldo contratual: R\$ 64.499.900,85;
- Saldo empenhado: R\$ 23.182.979,22;
- Prazo de término dos serviços: dez/2018;

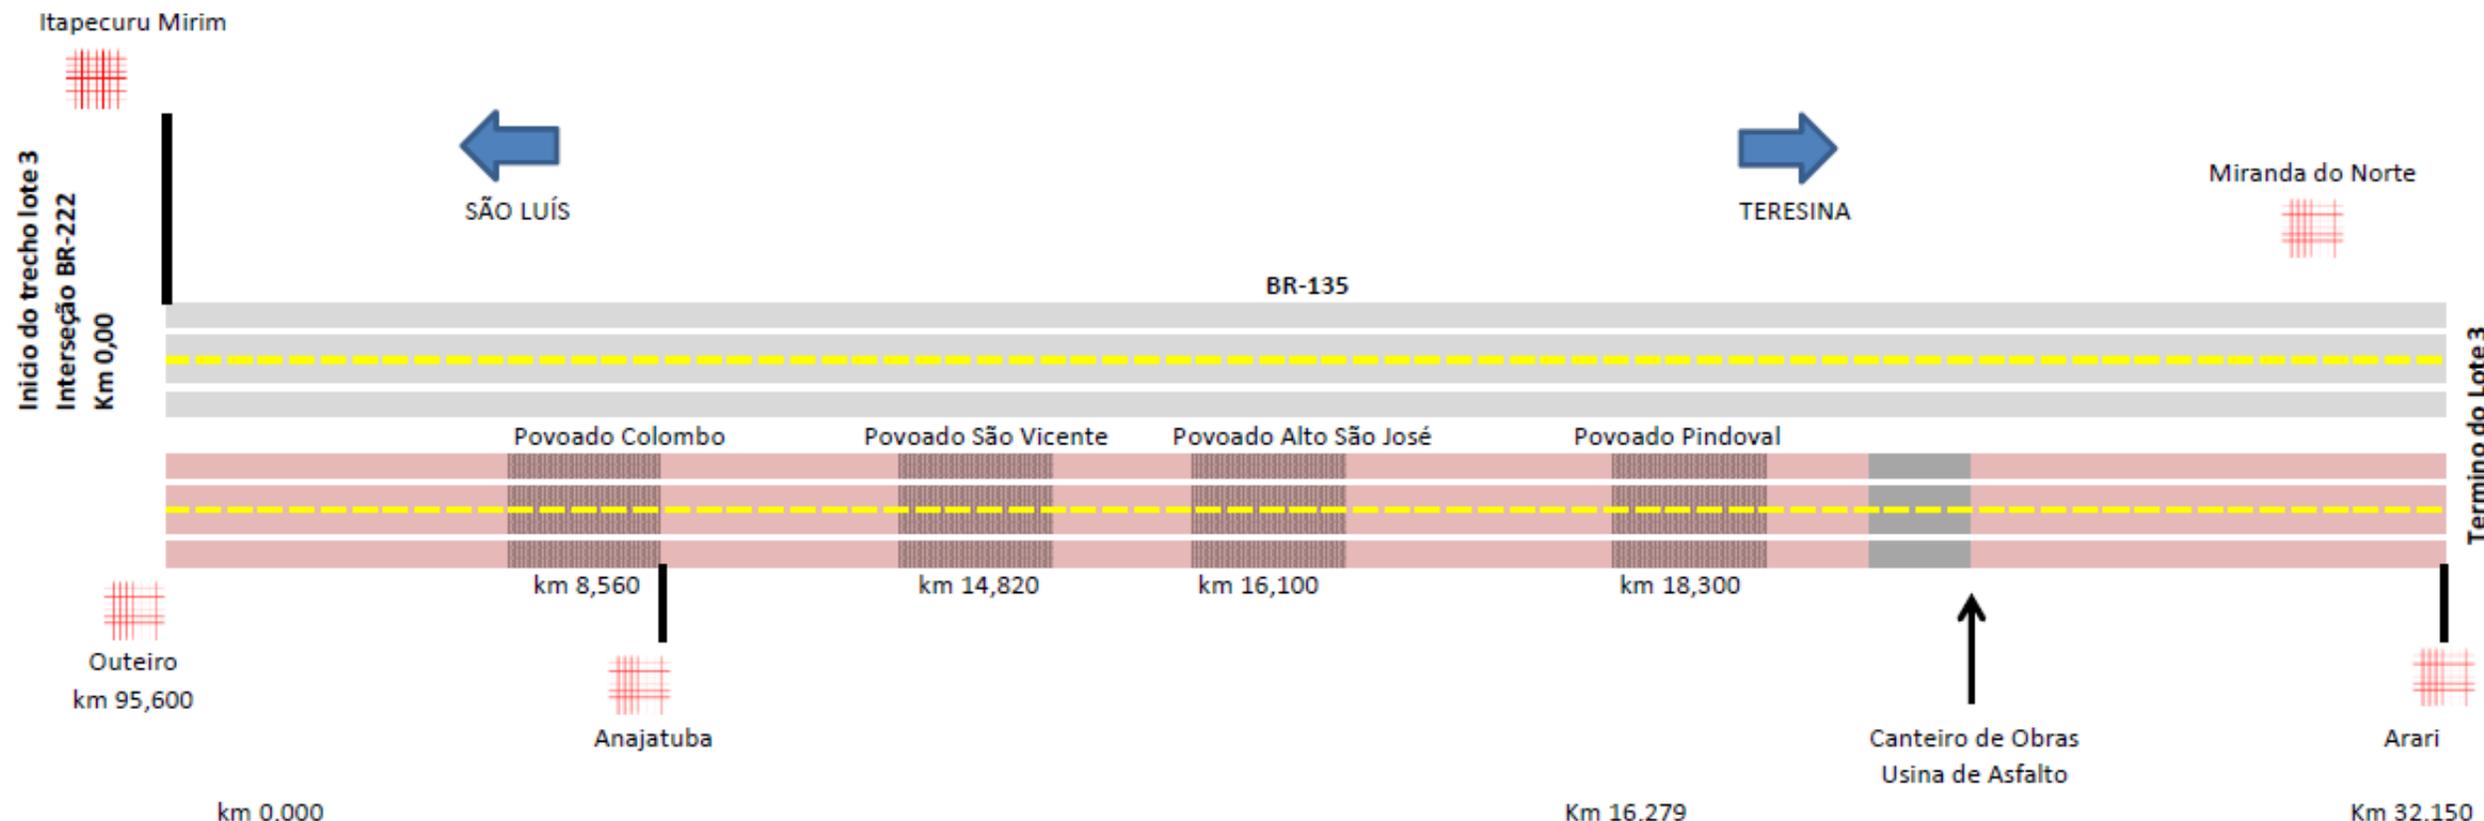

Topografia	[Grey bar from km 0,000 to km 32,150]	
Desmat. E Limpeza	[Grey bar from km 16,279 to km 32,150]	
Drenagem - Bueiros	[Blue bar from km 16,279 to km 21,960] [Grey bar from km 21,960 to km 22,940] [Blue bar from km 22,940 to km 32,150]	
Terraplenagem	[Blue bar from km 21,960 to km 22,940]	
Sub-base	[Blue bar from km 21,960 to km 22,940]	
Base	[Blue bar from km 21,960 to km 22,940]	
CBUQ	[Blue bar from km 21,960 to km 22,940]	
Drenagem - Superficial	[Blue bar from km 21,960 to km 22,940]	

Á EXECUTAR     
  EXECUTADO PARCIAL     
  EXECUTADO

### 3. Duplicação BR-135/MA: Outeiro/Miranda



Terraplenagem e execução de camada




Execução de bueiro

# 4. Pavimentação BR-226/MA e Contorno BR-316/MA

- Segmento de execução: km 0,00 ao km 100,00 (BR-226/MA) e km 609,40 ao km 620,90 (BR-316/MA), totalizando 111,50 km de extensão;
- Valor do contrato atualizado: R\$ 97.815.775,79;
- Total medido até o mês de fevereiro/2018: R\$ 8.636.650,04 (8,96%);
- Saldo contratual: R\$ 89.179.125,75;
- Saldo empenhado: R\$ 38.335.775,34;
- Prazo de término dos serviços: jun/2018;

Teresina / Timon

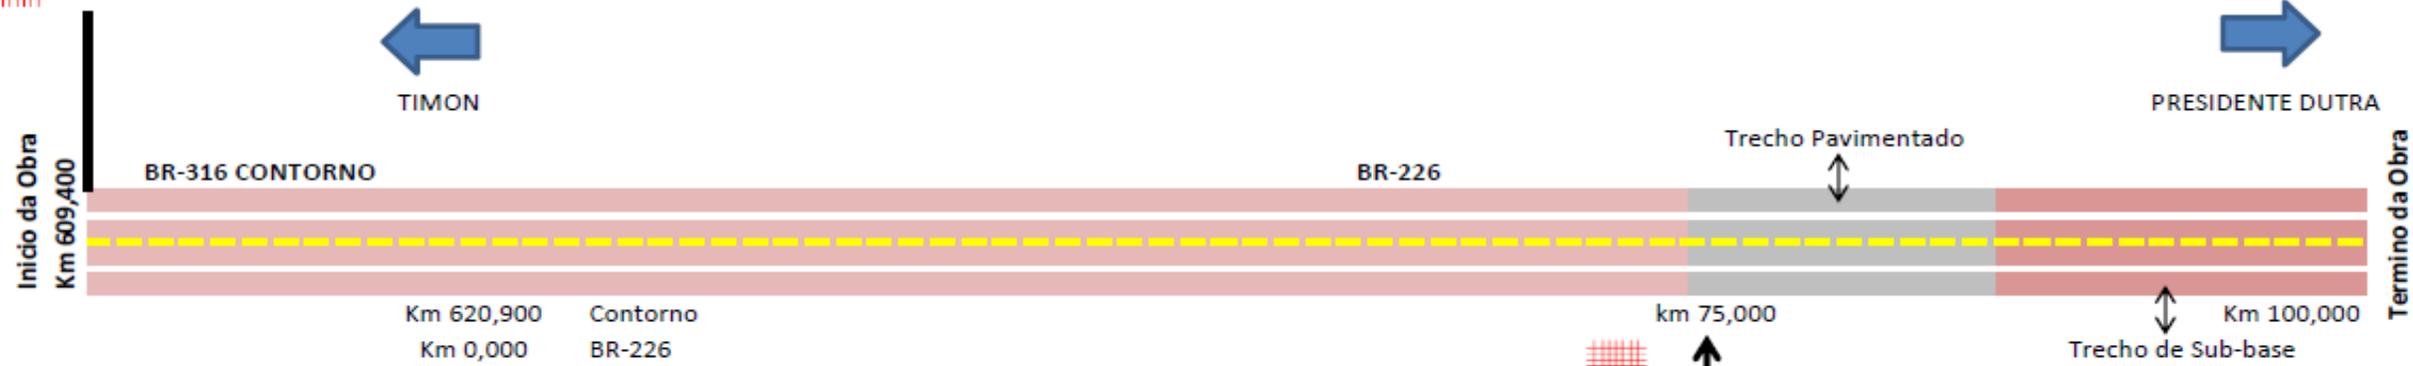

Contorno de Timon

BR-226

Topografia	Contorno de Timon		BR-226		
Desmat. E Limpeza	Contorno de Timon		BR-226		
Drenagem - Bueiros	Contorno de Timon		BR-226		
Terraplenagem	Contorno de Timon		BR-226		
Sub-base	Contorno de Timon		BR-226		
Base	Contorno de Timon		BR-226		
CBUQ	Contorno de Timon		BR-226		
Drenagem - Superficial	Contorno de Timon		BR-226		

Km 609,400 Km 620,900 Contorno Km 75,000 Km 83,000 Km 100,000  
 Km 0,000 BR-226

AGUARDANDO DESAPROPRIAÇÃO

EXECUTADO

AGUARDANDO ANÁLISE E APROVAÇÃO DA REVISÃO DE PROJETO

Á EXECUTAR

# 4. Pavimentação BR-226/MA e Contorno BR-316/MA



Terraplenagem




Pavimentação

# 5. Duplicação BR-010/MA: Travessia Imperatriz/MA

- Segmento de execução: km 246,40 ao km 260,80 (14,40 km de extensão);
- Valor do contrato atualizado: R\$ 207.504.443,53;
- Total medido até o mês de fevereiro/2018: R\$ 15.937.527,42 (7,93%);
- Saldo contratual: R\$ 191.566.916,11;
- Saldo empenhado: R\$ 13.499.863,59;
- Prazo de término dos serviços: set/2019;

# 5. Duplicação BR-010/MA: Travessia Imperatriz/MA

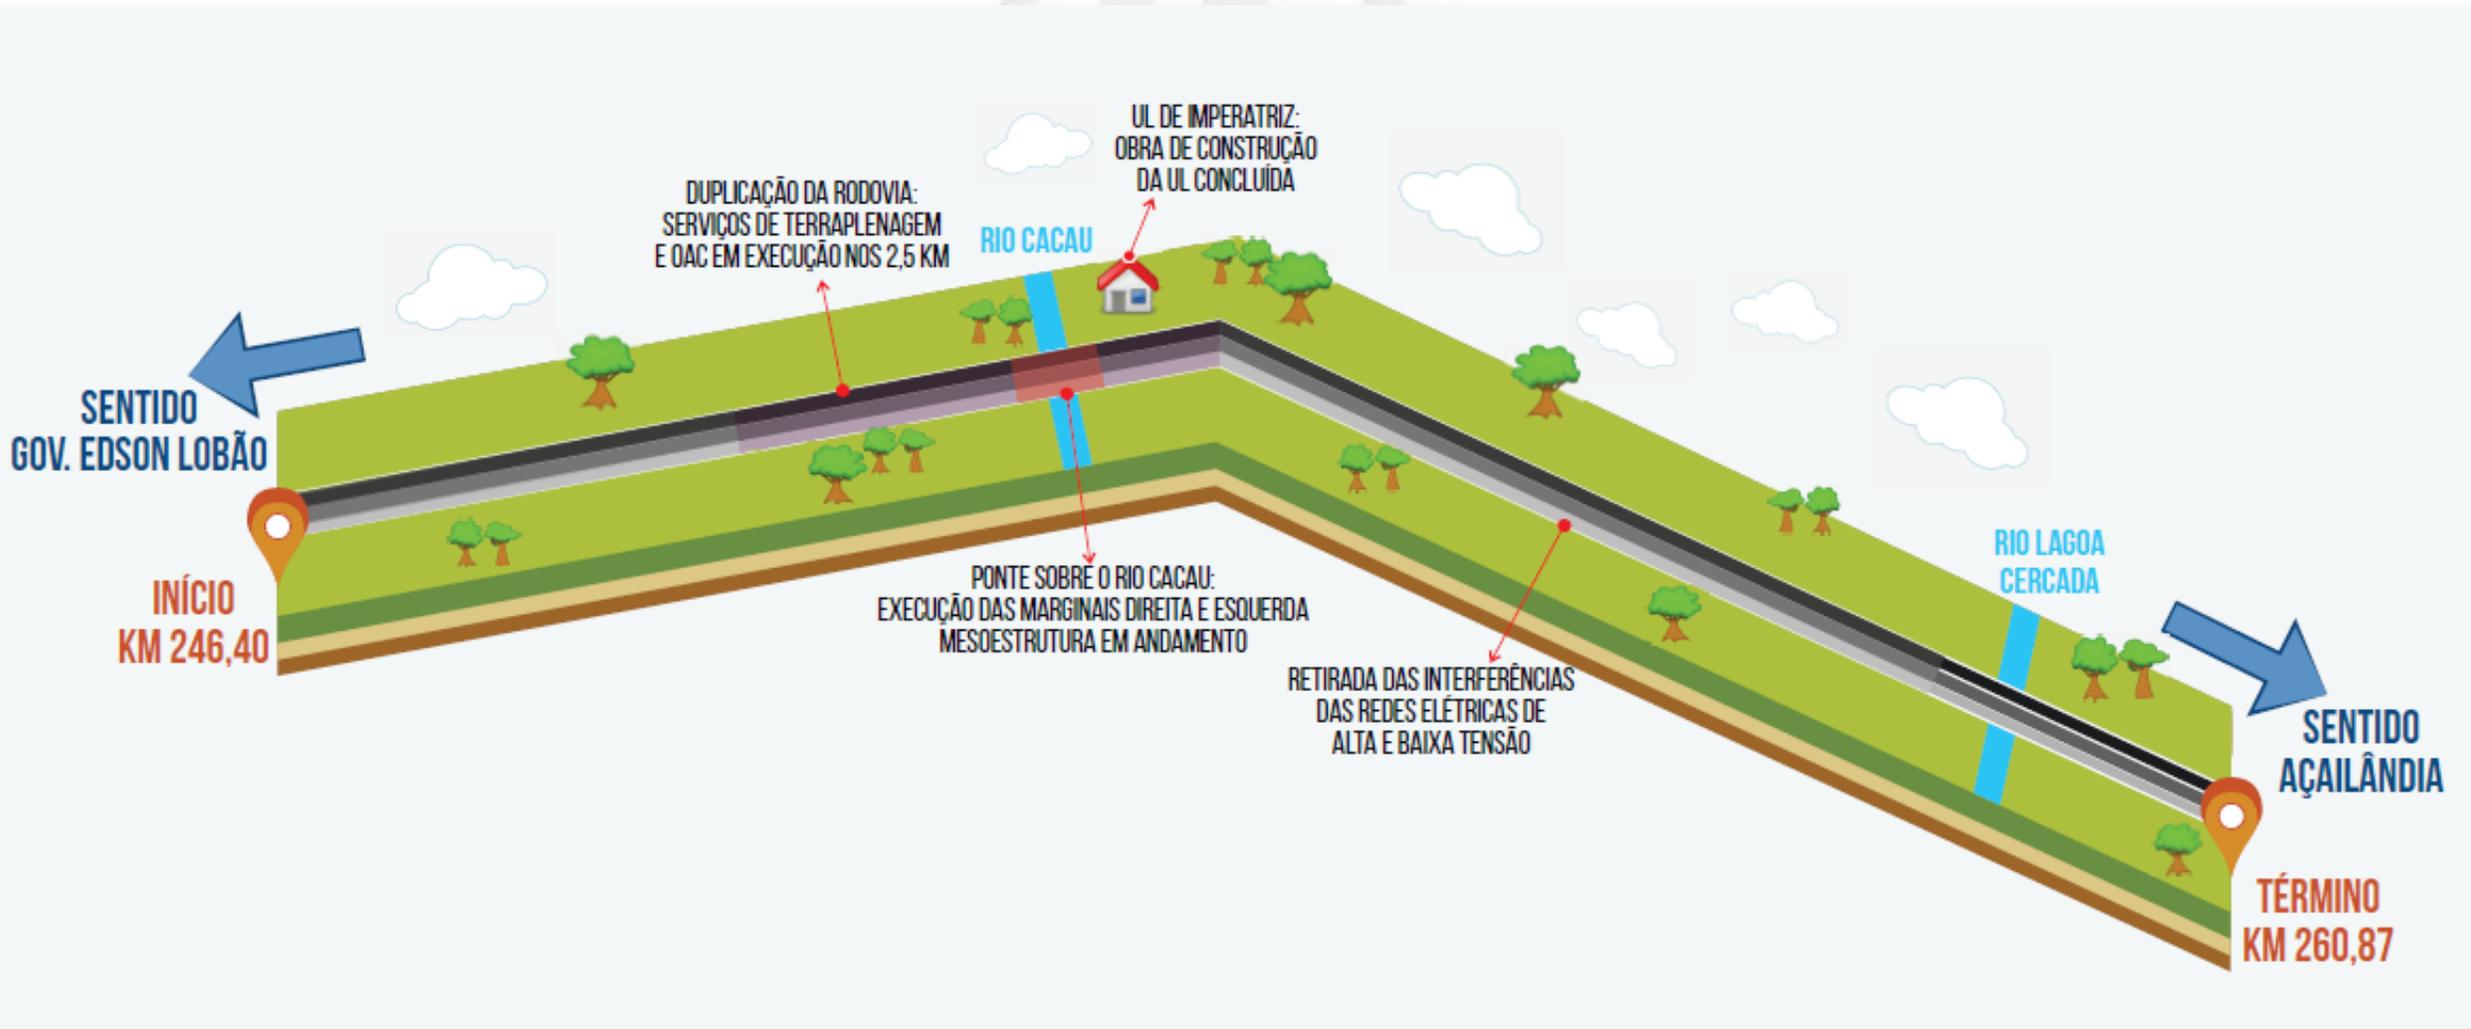

# 5. Duplicação BR-010/MA: Travessia Imperatriz/MA



Alargamento da Ponte sobre o Rio Cacau



Terraplenagem

# **DNIT**

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES



## **CONTATO**

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO MARANHÃO**

**Superintendente: Gerardo de Freitas Fernandes**

**Endereço: Rua Jansen Muller, 37 – Centro – CEP 65020-290 – São Luís/MA**

**Horário de Atendimento ao Público: das 08h às 12h e das 13:30h às 17:30h**

**Tel.: (98) 2106-6266 DIR.: (98) 2106-6269**

**Fax.: (98) 2106-6271**
